

A3 Laboratorio Clínico Veterinario

Avance del proyecto — de lo acordado a lo entregado

Fecha: 2 de agosto de 2026 Proyecto: 28/01/2026 – 02/06/2026 Preparado por: Zidong LLC

81%
DEL ALCANCE

El **agente conversacional**, el **portal de clientes**, el **dashboard gerencial** y la **facturación** están contruidos y funcionando sobre datos reales de A3. Lo que resta se concentra en la integración con el sistema de laboratorio, detenida a la espera de los accesos técnicos.

4

Sistemas operando

Agente conversacional, portal web, dashboard y facturación, integrados sobre una misma base de datos.

615

Registros del catálogo

133 perfiles, 159 análisis y 323 razas cargados con precios y descuentos reales del portafolio.

2

Accesos pendientes

Las credenciales de Anarvet y la cuenta de WhatsApp Business son hoy el único freno del proyecto.

1. Lo que se acordó

El proyecto se estructuró en tres fases sobre 16 semanas, según la propuesta y el plan de trabajo aprobados el 28 de enero.

Fase	Duración	Compromiso
Fase 1	4 semanas	Bot con inteligencia artificial 24/7, validación automática de datos, envío automático al motorizado y notificaciones por etapa
Fase 2	7 semanas	Hub de integración con los sistemas del laboratorio, facturación, inventarios y logística, con coordinación entre ellos
Fase 3	5 semanas	Portal web de clientes, solicitud en línea, seguimiento, descarga de resultados 24/7 y dashboard gerencial de indicadores

A eso se sumaron, el 20 de mayo, **diez ajustes al guion conversacional** solicitados por A3. Hoy están resueltos o cubiertos todos salvo la transcripción de la orden por foto, retirada del alcance de común acuerdo.

2. Cómo atiende el agente hoy


Este es el recorrido real de una solicitud, desde que la veterinaria escribe hasta que la orden queda registrada y facturada. Cada paso está construido y en funcionamiento.




● Construido y en funcionamiento ● Derivación a un área humana, por diseño

3. Cómo se conecta con los sistemas

El agente es el punto de entrada y coordina el resto. Todo lo que aparece en verde está conectado y operando; en ámbar, lo que espera accesos de A3.

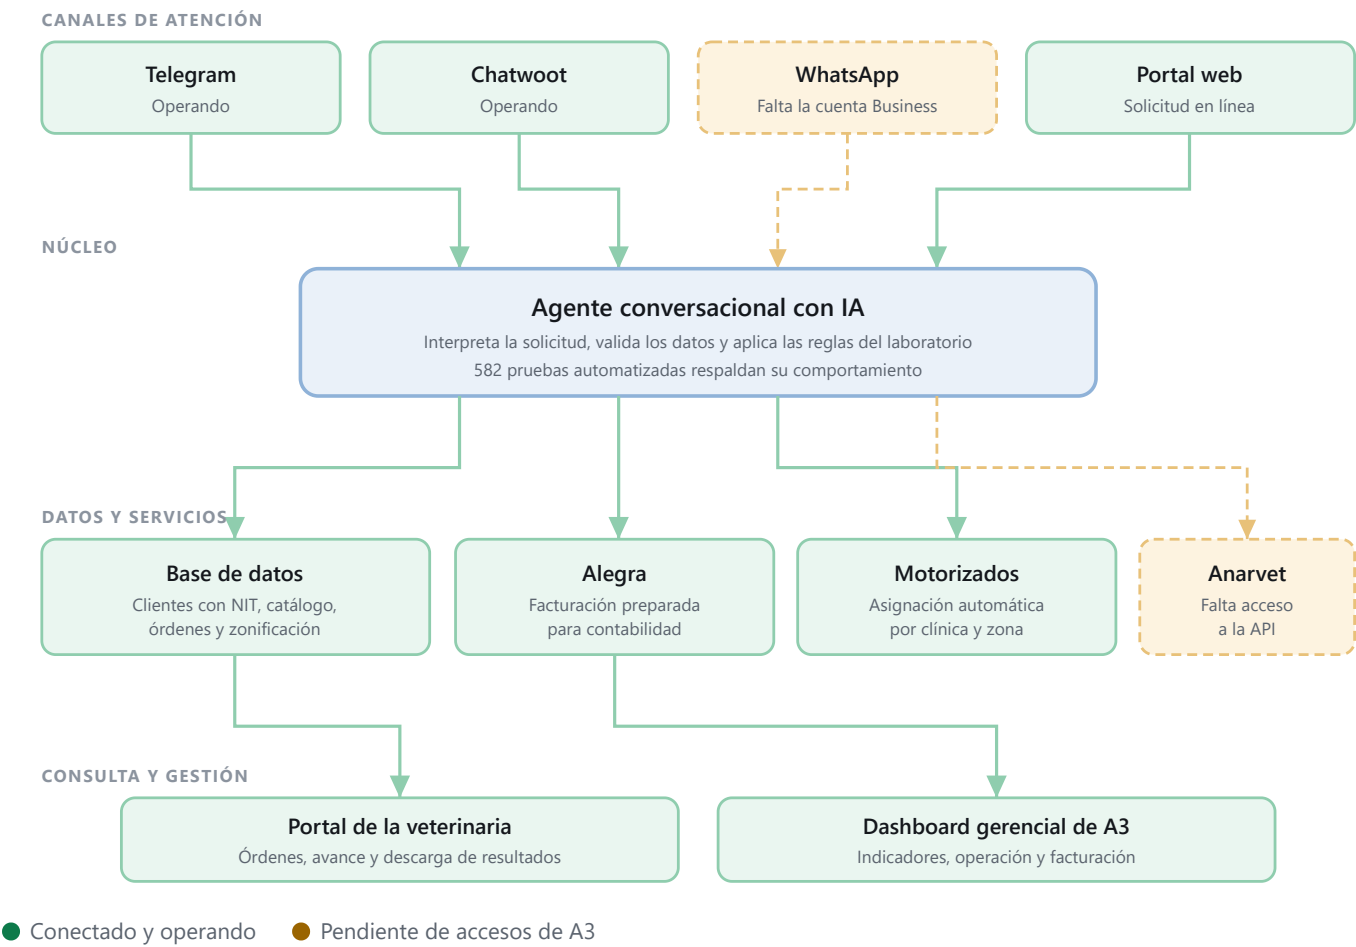

4. Avance por fase

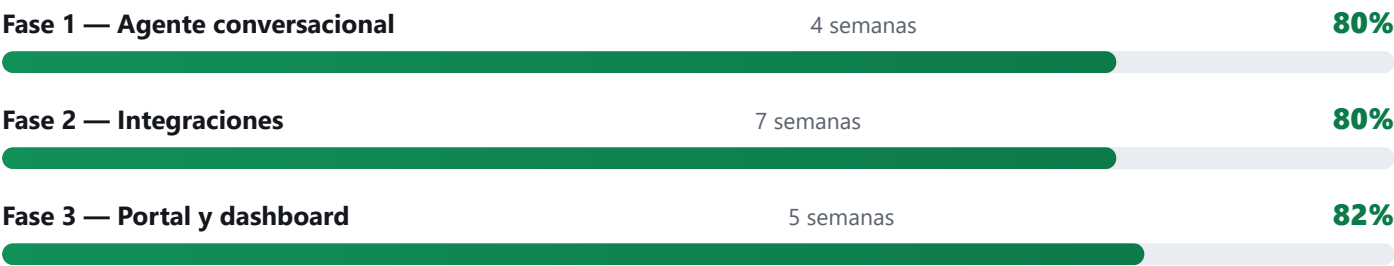

Qué incluye cada fase, en detalle

Componente	Estado	Detalle
Agente conversacional 24/7	ENTREGADO	Identificación de clínica, sedes múltiples, orden completa y validación de datos
Catálogo con precios reales	ENTREGADO	133 perfiles, 159 análisis y 323 razas, con descuentos por volumen
Asignación de motorizado	ENTREGADO	Automática por clínica, con horario de corte de las 17:30
Facturación	ENTREGADO	Factura preparada en Alegria para que contabilidad revise y emita
Zonificación de Bogotá	ENTREGADO	8 zonas y 1.649 barrios con cobertura por motorizado
Portal: solicitud en línea	ENTREGADO	Con el catálogo completo y su precio, igual que por chat
Portal: seguimiento de la orden	ENTREGADO	Avance paso a paso e historial de movimientos de cada solicitud
Portal: resultados 24/7	ENTREGADO	Búsqueda, descarga individual y descarga masiva en un solo archivo
Dashboard gerencial	ENTREGADO	Nueve pantallas con indicadores de operación y de negocio
Integración con Anarvet	DETENIDO	La orden ya está lista para volcarse; falta el acceso a la API
Canal WhatsApp	DETENIDO	El agente ya opera; falta conectar la cuenta Business
Control de inventarios	EN CURSO	Módulo sobre Alegria, en reemplazo de DelSol
Gráficos de evolución	EN CURSO	Tendencias y tiempo de respuesta promedio en el dashboard

5. Componentes resueltos de otra manera

Durante el proyecto se acordó cubrir varias funciones de forma distinta a la planteada originalmente, manteniendo el resultado para la operación.

Planteado originalmente	Cómo quedó resuelto
Siigo — facturación	Alegra, integrado y operando
DelSol — gestión	Consolidado en Alegra, todo en un solo lugar
LiveConnect — logística	Chatwoot, ya en operación
Tracking GPS en tiempo real	Avance de la orden paso a paso en el portal, ya entregado
Facturación ante la DIAN	El sistema deja la factura preparada; contabilidad de A3 emite
Notificaciones por correo	Avisos por chat y bandeja del portal
Alta de clientes por chat	Se deriva a recepción para validación humana
Transcripción de la orden por foto	Retirado del alcance de común acuerdo

6. Lo que necesitamos de A3

El plan de trabajo aprobado el 28 de enero fija dos entregas a cargo de A3 que continúan pendientes. Son hoy el principal freno del proyecto.

Compromiso	Fecha acordada	Situación actual
Accesos y documentación técnica	Viernes 30/01/2026 Día 4 del plan	Credenciales, ambientes de prueba, contactos técnicos y documentación de la API. Pendiente.
Accesos de QA y producción	Lunes 02/03/2026 Día 25 del plan	Accesos a los ambientes y habilitación de direcciones si corresponde. Pendiente.

Checklist de lo que se requiere

- ☐ **Acceso a la API de Anarvet / LAB3**
Dirección del servicio, credenciales de autenticación y documentación. Es el único bloqueante que impide cerrar la Fase 2: la orden de servicio ya está construida y lista para volcarse apenas exista el acceso.
- ☐ **Cuenta de WhatsApp Business**
Número verificado y cuenta habilitada. El agente ya está operando y solo debe conectarse al nuevo canal.
- ☐ **Cuenta de facturación de producción**
Junto con la definición del IVA por tipo de análisis y del régimen tributario por cliente, para pasar la facturación del ambiente de pruebas al real.
- ☐ **Confirmación del ambiente de publicación**
Para dejar el sistema disponible de forma permanente y no depender del entorno de trabajo actual.
- ☐ **Responsable técnico de contacto**
Una persona de A3 con quien coordinar la entrega de accesos y resolver dudas de integración sin pasar por reuniones.

Impacto en el cronograma. La Fase 2 representa 7 de las 16 semanas del proyecto y su eje era la integración con los sistemas del laboratorio. Tres de los cuatro sistemas se resolvieron de forma equivalente. El cuarto —Anarvet— continúa detenido desde el 30 de enero a la espera de los accesos. Cada semana sin ellos se traslada directamente a la fecha de cierre.

7. Próximos pasos propuestos

- Fijar fecha de entrega de los accesos de Anarvet** con el responsable técnico de A3. Es el desbloqueo de mayor impacto.
- Confirmar la cuenta de WhatsApp Business** para habilitar el canal.
- Reunión de repriorización** para revisar el orden de lo pendiente y ajustar el cronograma de las fases 2 y 3 según los insumos disponibles.

El avance del 81 % se calcula sobre el alcance vigente del proyecto, descontando los componentes detenidos a la espera de los accesos detallados en el punto 6.

Documento preparado por Zidong LLC para A3 Laboratorio Clínico Veterinario S.A.S. El detalle técnico de cada componente está disponible a solicitud.
